

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

令和4年1月6日

計画の名称	二戸市公共下水道整備計画（防災・安全）		
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）	交付対象	二戸市
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。		

下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

計画の成果目標（定量的指標）

①二戸浄化センター及び長瀬ポンプ場の長寿命化対策の実施率を0%（H27）から82%（H31）に増加させる。

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)	
① 二戸浄化センター及び長瀬ポンプ場の長寿命化対策の実施率 改築工事実施済施設数（箇所） / 改築工事が必要な施設数（箇所）	0%	50%	82%	

上段：計画 下段：実施

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	173百万円 152百万円	A	173百万円 152百万円	B	0百万円 0百万円	C	0百万円 0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0% 0.0%
-------	-----------------	------------------	---	------------------	---	--------------	---	--------------	---------------------------	--------------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
二戸市下水道事業特別会計財政健全化検討委員会にて事後評価を実施	令和4年1月
	公表の方法
	二戸市ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A 下水道										上段：計画					下段：実施		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H27	H28	H29	H30	H31		
二戸処理区																	
A-1-1	下水道	過疎	二戸市	直接	-	処理場	改築	二戸浄化センター	長寿命化計画策定 長寿命化計画策定	二戸市						7	
A-1-2	下水道	過疎	二戸市	直接	-	処理場	改築	二戸浄化センター	建築設備、電気設備 建築設備、電気設備	二戸市						155	
A-1-3	下水道	過疎	二戸市	直接	-	汚水	改築	長瀬ポンプ場	計装機器 計装機器	二戸市						3	
A-1-4	下水道	過疎	二戸市	直接	-	汚水	改築	調査・設計	中央監視装置詳細設計 中央監視装置詳細設計	二戸市						8	
											合計	173					
												152					

B 関連社会資本整備事業								要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	施設 種別	省略 工種				H22	H23	H24	H25	H26		
											合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業								要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	施設 種別	省略 工種				H22	H23	H24	H25	H26		
											合計						

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業								要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	施設 種別	省略 工種				H22	H23	H24	H25	H26		
											合計						

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・長寿命化計画計画に基づく改築工事を実施することにより、ライフサイクルコスト最小化を図ることが出来た。										
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II 定量的指標の達成状況	指標③ (処理場及びポンプ場の長寿命化計画の実施率)	最終目標値	82%	目標値と実績値に差が出た要因	計画通り事業の実施を行うことが出来た。
		最終実績値	82%		

III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



3. 特記事項 (今後の方針等)

・引続き各事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

社会資本整備総合交付金

二戸市公共下水道整備計画

(防災・安全)

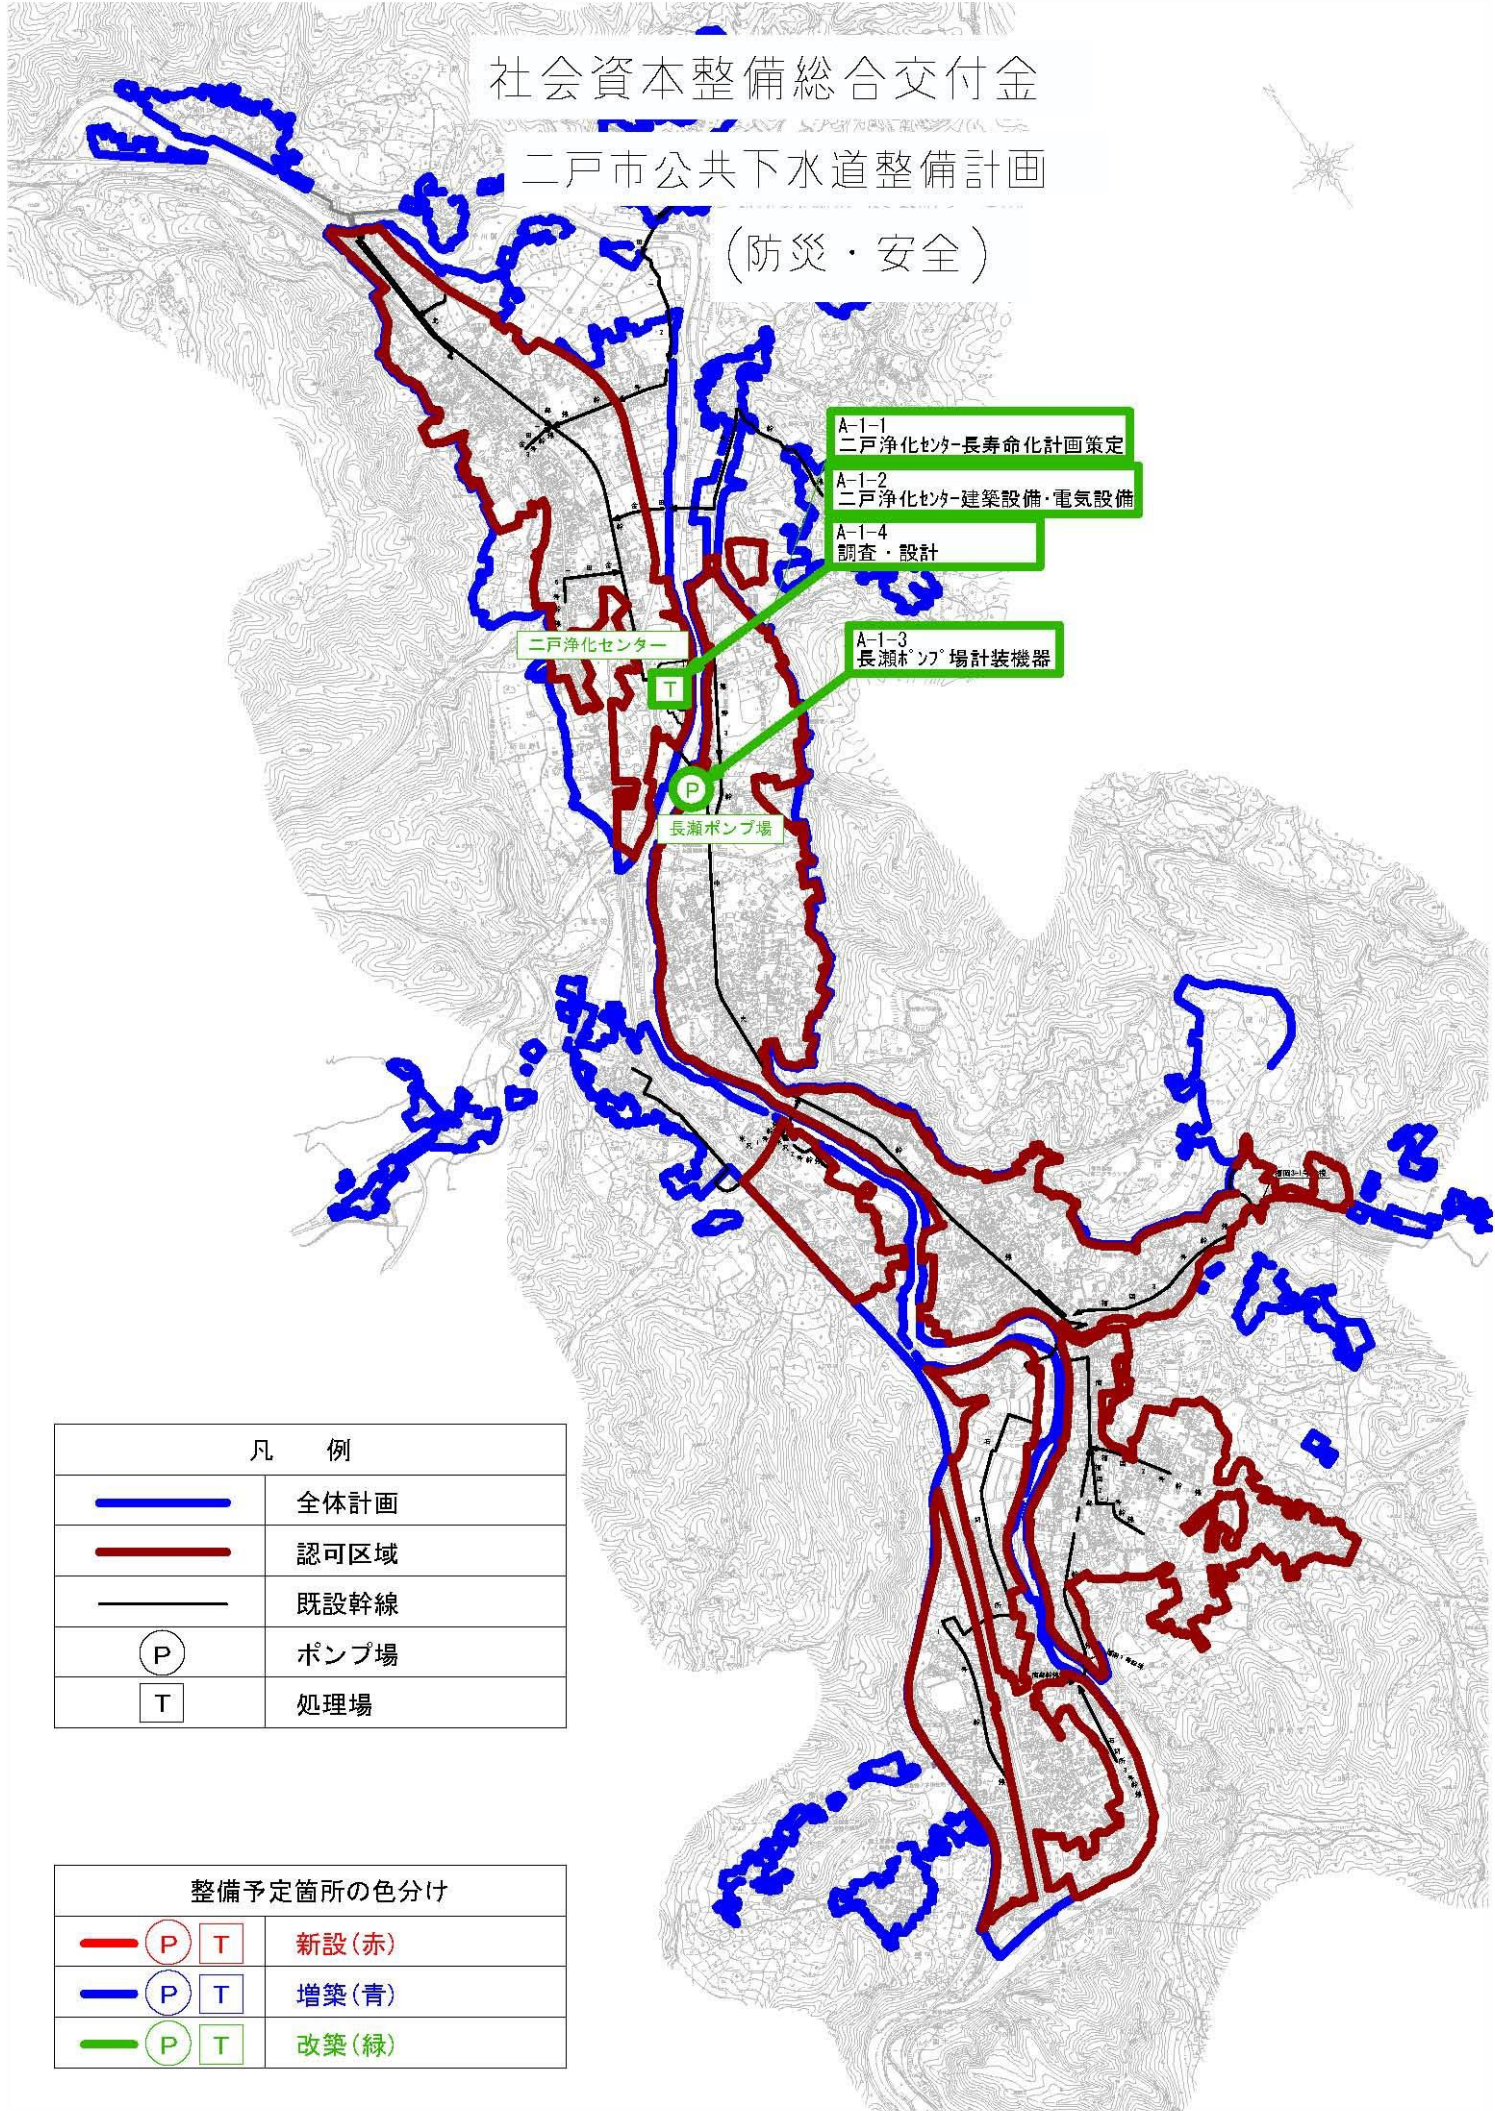

- A-1-1 二戸浄化センター-長寿命化計画策定
- A-1-2 二戸浄化センター-建築設備・電気設備
- A-1-4 調査・設計

二戸浄化センター

A-1-3 長瀬ポンプ場計装機器

長瀬ポンプ場

凡 例	
	全体計画
	認可区域
	既設幹線
	ポンプ場
	処理場

整備予定箇所の色分け	
	新設(赤)
	増築(青)
	改築(緑)
