（参考様式２）社会資本総合整備計画　事後評価書

平成３１年　３月１９日

計画の名称	二戸市公共下水道整備計画		
計画の期間	平成２７年度～平成２９年度（３年間）	交付対象	二戸市

計画の目標

下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

計画の成果目標（定量的指標）

①下水道処理人口普及率を42%（H27)から45%（H29)に増加させる。

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値（H27当初）	中間目標値（H28末）	最終目標値（H29末）	備考
① ①下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人）	42%	44%	45%	

上段：計画　下段：実施

全体事業費	合計（A＋B＋C）	A	B	C	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C）
	632百万円	632百万円	0百万円	0百万円	0.0%
	631百万円	631百万円	0百万円	0百万円	0.0%

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

二戸市社会資本総合整備計画事後評価検討会にて事後評価を実施

事後評価の実施時期

平成31年3月

公表の方法

二戸市ホームページにて公表

１．交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A　下水道

上段：計画　下段：実施

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H27	H28	H29			全体事業費（百万円）	備考
二戸処理区																	
A-1-1	下水道	一般	二戸市	直接	二戸市	汚水	新設	幹線（未普及解消）（二戸処理区）	A=192ha	二戸市						539	
									A= 38ha							538	
A-1-2	下水道	一般	二戸市	直接	二戸市	汚水	新設	調査・設計（二戸処理区）	A=192ha	二戸市						63	
									A= 58ha							63	
A-1-3	下水道	一般	二戸市	直接	二戸市	全種	全種	効率的汚水処理整備計画	アクションプラン策定	二戸市						5	
									アクションプラン策定							5	
浄法寺処理区																	
A-2-1	下水道	一般	二戸市	直接	二戸市	処理場	増設	調査・設計（浄法寺処理区）	自家発電設備詳細設計	二戸市						1	
									自家発電設備詳細設計							1	
A-2-2	下水道	一般	二戸市	直接	二戸市	処理場	増設	浄法寺浄化センター	自家発電設備	二戸市						24	
									自家発電設備							24	
															合計	632	
																631	

B　関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H22	H23	H24	H25	H26	全体事業費（百万円）	備考
															合計		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

C　効果促進事業

上段：計画　下段：実施

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度） H22	H23	H24	H25	H26	全体事業費（百万円）	備考
															合計	0 0	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

2．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況

・幹線管渠の整備により、下水道処理人口普及率を増加することが出来た。
・浄法寺浄化センターに自家発電設備を設置したことにより、停電発生時の施設の安全度が向上した。

Ⅱ定量的指標の達成状況

指標①（下水道処理人口普及率）			目標値と実績値に差が出た要因
最終目標値	45% 12,380人 ／ 27,306人		計画通り事業の実施を行うことが出来た。
最終実績値	45.38% 12,384人 ／ 27,292人		

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況（必要に応じて記述）

3．特記事項（今後の方針等）

・引続き各事業を進めることにより、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

（参考様式３）　　（参考図面）二戸市公共下水道整備計画

計画の名称	二戸市公共下水道整備計画		
計画の期間	平成２７年度～平成２９年度（３年間）	交付対象	二戸市

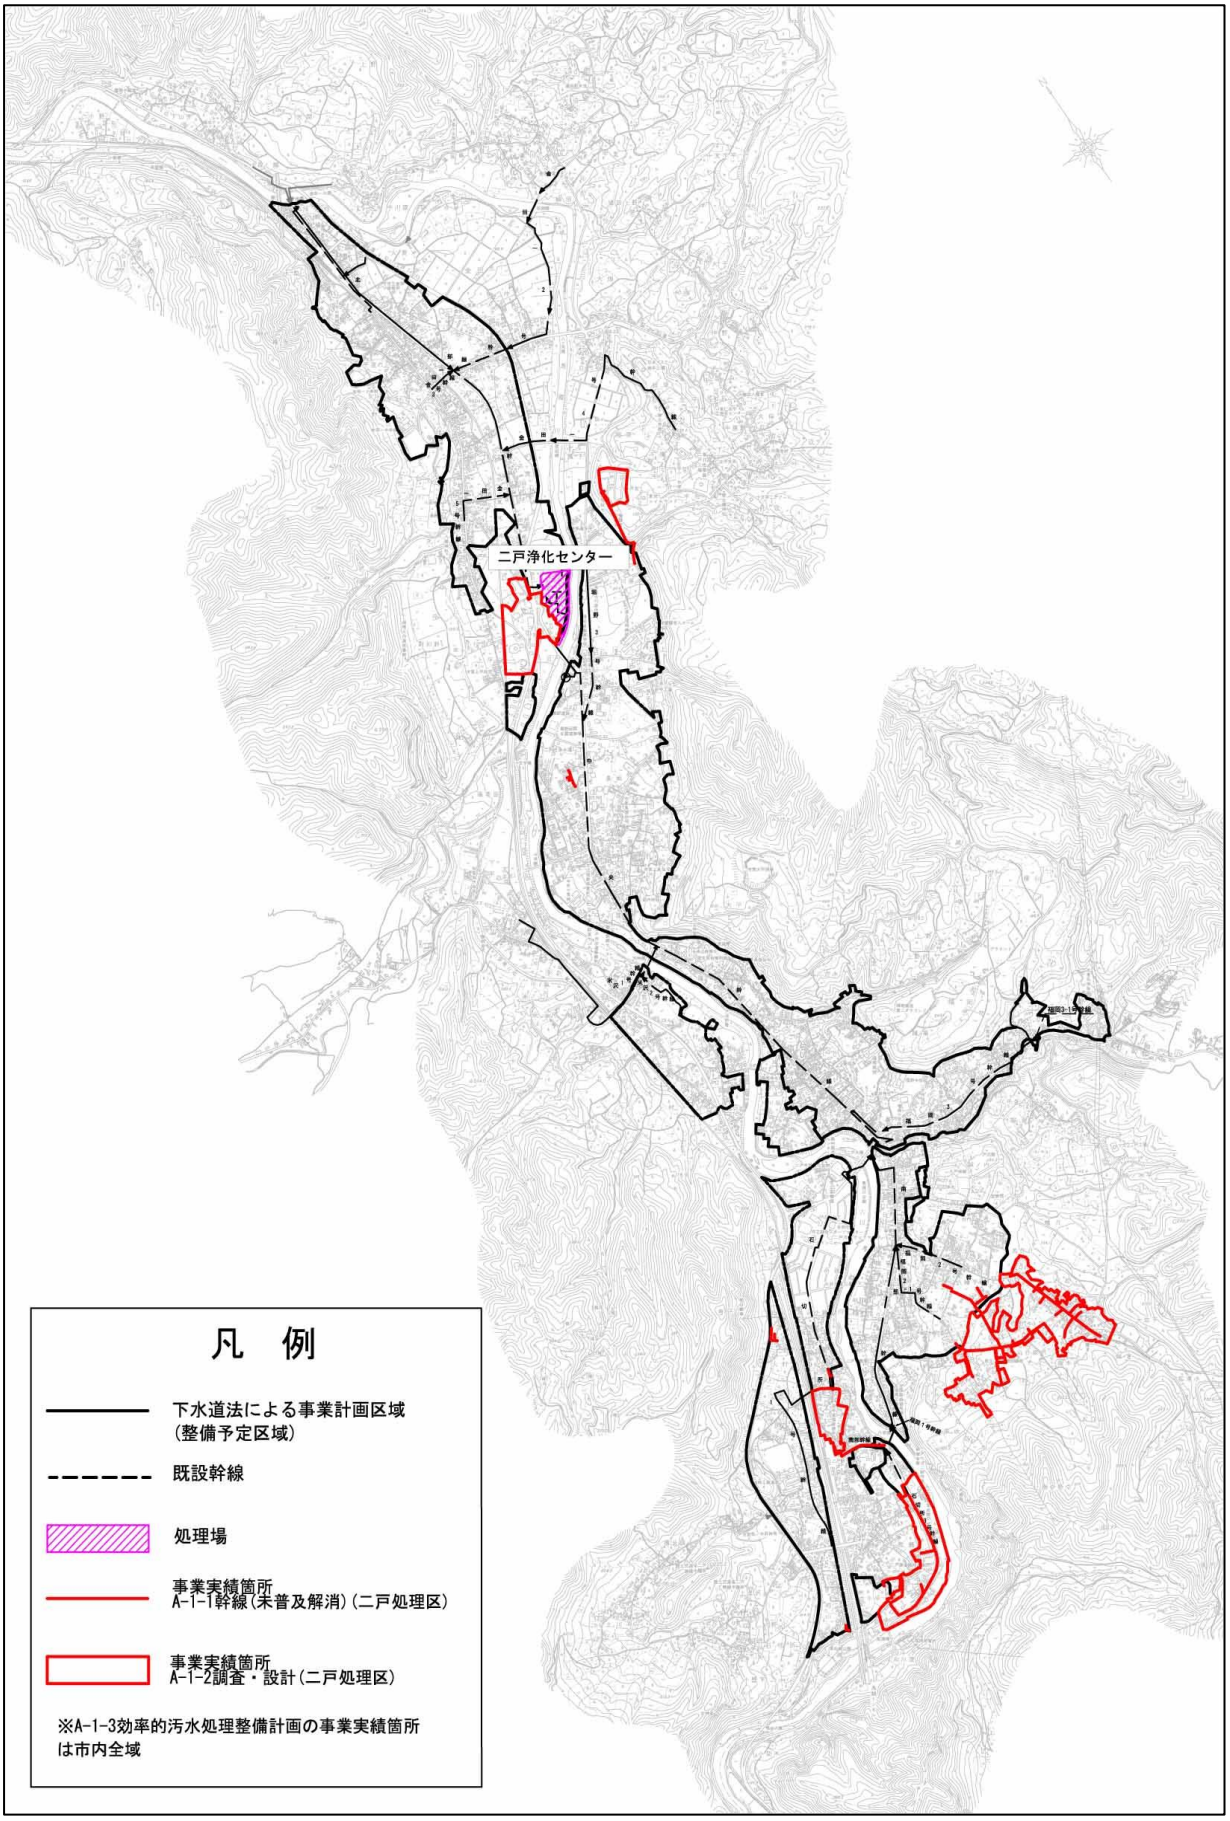

（参考様式３）　　（参考図面）二戸市公共下水道整備計画
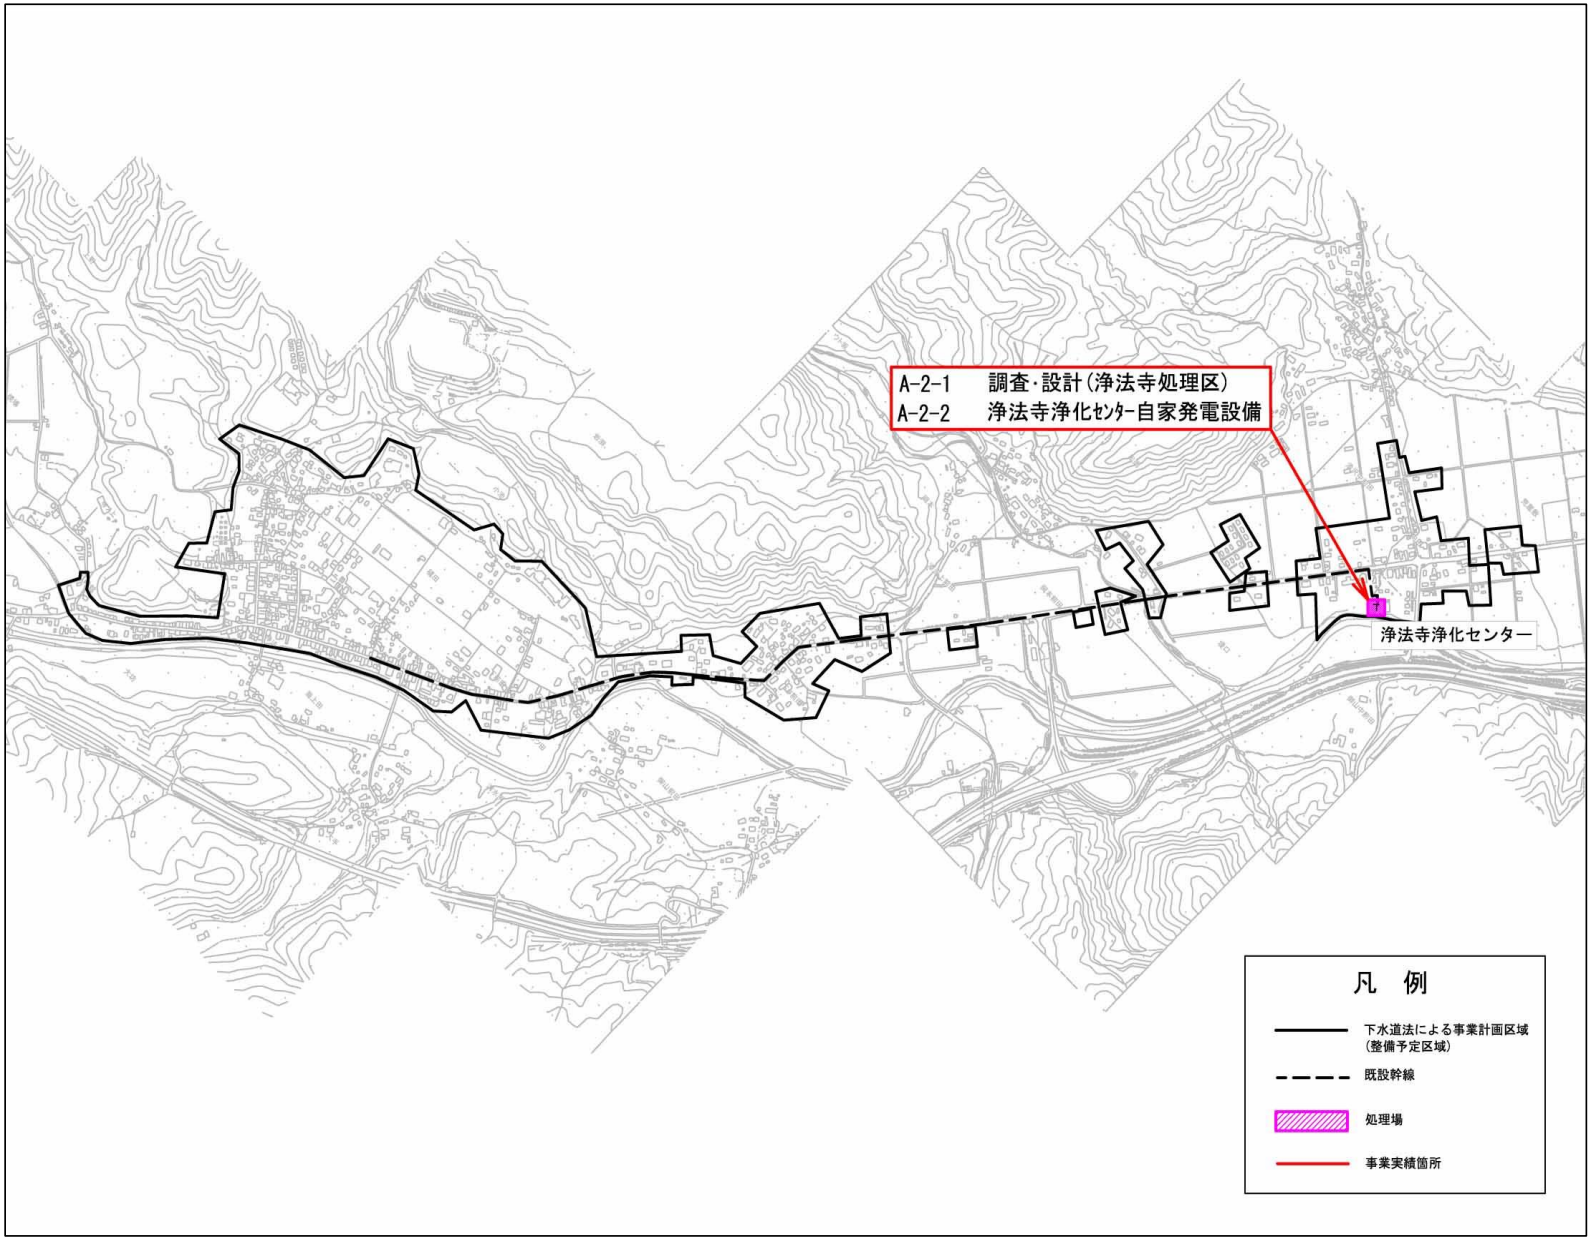
計画の名称	二戸市公共下水道整備計画		
計画の期間	平成２７年度～平成２９年度（３年間）	交付対象	二戸市
